Gestor de Projeto

MANUAL DO USUÁRIO

Planeje, acompanhe e antecipe riscos em um único arquivo.

Timeline com dependências, reuniões de follow-up, insights automáticos, CFD e alertas — explicado passo a passo, com telas reais do app.



Versão 1.0

Novembro de 2026

CONTEÚDO

Sumário

01 **Conheça o Gestor de Projeto** 2
O que o app faz, para quem é e como está organizado

02 **Primeiros passos** 4
Criar o projeto, carregar o exemplo e salvar pela primeira vez

03 **Conceitos essenciais** 6
Status, progresso planejado × real, SPI, WIP, fluxo e caminho crítico

04 **Montando a timeline** 8
Cadastrar tarefas, marcos e dependências, ou importar da planilha

05 **Timeline (Gantt)** 11
Ler o cronograma, ver o caminho crítico e reagendar

06 **Lista de tarefas** 13
Filtrar, acompanhar desvios e exportar

07 **Visão geral** 14
Saúde do projeto, indicadores, insights e alertas principais

08 **Reuniões de follow-up** 17
Pauta, atualização das tarefas, decisões, ações, ata e PDF

09 **CFD & Métricas de fluxo** 21
Como ler o CFD e usar as métricas para encontrar gargalos

10 **Alertas** 23
Quais alertas existem, quando disparam e o que fazer

11 **Configurações do projeto** 25
Dados do projeto, limites e manutenção dos dados

12 **Salvar, compartilhar e proteger os dados** 26
Como o arquivo guarda os dados, backup e SharePoint

13 **Rotina recomendada** 28
Um roteiro semanal para tirar o máximo do app

14 **Perguntas frequentes** 29
Dúvidas e problemas mais comuns

CAPÍTULO 01

Conheça o Gestor de Projeto

O Gestor de Projeto reúne, em um único arquivo HTML, tudo o que é preciso para planejar a timeline de um projeto, acompanhá-la nas reuniões de follow-up e enxergar cedo os riscos — com insights, CFD e alertas gerados automaticamente.

Não há instalação, servidor ou login. Você abre o arquivo no navegador, trabalha e clica em **Salvar**: os dados ficam gravados dentro do próprio HTML, que pode ser guardado numa pasta, copiado ou enviado como qualquer documento.

O que você pode fazer

Planejar a timeline
Tarefas por fase, responsáveis, marcos e dependências entre tarefas, com importação direto do Excel.

Conduzir follow-ups
Pauta automática, atualização das tarefas na data da reunião, decisões, ações, ata e PDF.

Receber insights
Leitura automática do andamento: atraso, previsão de término, ritmo necessário, gargalos.

Ver o fluxo (CFD)
Diagrama de fluxo cumulativo, curva S, vazão, tempo de ciclo, lead time e WIP.

Ser alertado
Atrasos, bloqueios, riscos, conflitos de dependência e ações vencidas, por severidade.

Um arquivo só
Funciona offline, guarda os dados em si mesmo e protege contra gravação indevida no SharePoint.

Como o app está organizado

A barra superior traz o nome e o prazo do projeto, as abas e os botões de salvar. Cada aba responde a uma pergunta do gestor:

ABA	RESPONDE À PERGUNTA
Visão geral	Como está o projeto hoje? Vamos cumprir o prazo?
Timeline	O que acontece quando, e o que depende do quê?
Tarefas	Qual a situação de cada tarefa e onde estão os desvios?
Follow-ups	O que mudou desde a última reunião e o que foi combinado?
CFD & Métricas	O trabalho está fluindo? Onde ele está represado?
Alertas	O que precisa de atenção agora?
Projeto	Quais são as datas, os limites e onde estão os dados?

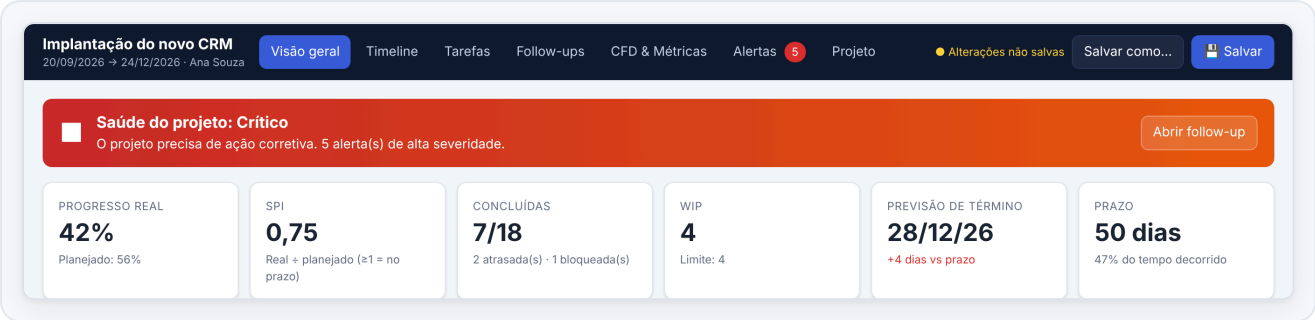


Figura 1 — Barra superior com as abas e o topo da Visão geral: saúde do projeto e indicadores principais.

CAPÍTULO 02

Primeiros passos

Em poucos minutos você cria o projeto, monta a timeline e salva. Se preferir conhecer o app antes, carregue o projeto de exemplo.

Abrir o arquivo

Use o **Microsoft Edge** ou o **Google Chrome**: neles o botão Salvar grava direto no arquivo. Dê dois cliques no `gestor-projeto.html` ou arraste-o para uma aba do navegador. Na primeira abertura aparece a tela de boas-vindas.

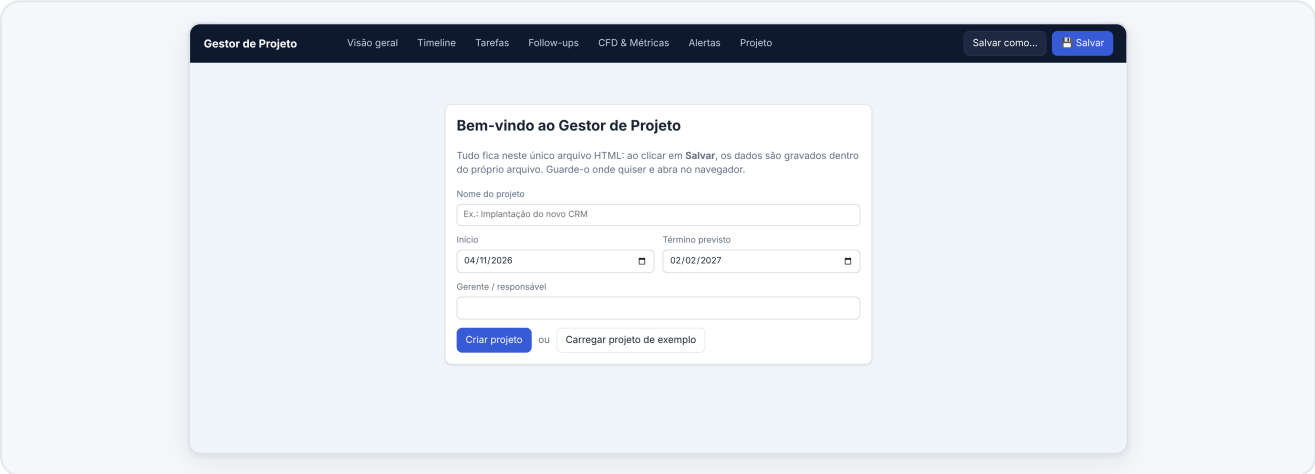


Figura 2 — Tela de boas-vindas: crie um projeto novo ou carregue o projeto de exemplo.

Criar o projeto em 4 passos

1. **Informe nome, início, término previsto e gerente** e clique em **Criar projeto**. O término é o prazo usado em todos os cálculos de atraso.
2. **Monte a timeline**: cadastre as tarefas uma a uma (**+ Tarefa**) ou cole a planilha em **Importar** (capítulo 4).
3. **Ligue as dependências** entre as tarefas, se houver, para ver o caminho crítico e os atrasos em cascata.
4. **Salve** com o botão 💾 **Salvar** ou Ctrl + S. Na primeira vez, escolha o próprio arquivo para sobrescrevê-lo (capítulo 12).

> ★ **Explore primeiro com o exemplo**
> O botão **Carregar projeto de exemplo** cria a "Implantação do novo CRM": 18 tarefas em 5 fases, dependências, três follow-ups, atrasos, um bloqueio e um conflito de datas. Todas as imagens deste manual usam esse exemplo. Quando terminar, use **Projeto → Apagar todos os dados** e crie o seu.

Guarde o arquivo num lugar fixo

Mantenha o HTML numa pasta do computador (por exemplo, Documentos). Não trabalhe direto em um anexo de e-mail ou na visualização do SharePoint/Teams: o navegador abre uma cópia temporária e o app bloqueia o salvamento nesses casos.

CAPÍTULO 03

Conceitos essenciais

Seis status, dois percentuais e algumas métricas de fluxo sustentam todos os cálculos do app. Entendê-los torna os insights e alertas óbvios.

Status das tarefas

Cada tarefa está sempre em um destes seis status. A cor é a mesma em todo o app: timeline, listas, CFD e relatórios.

STATUS	QUANDO USAR	CONTA NO WIP
Backlog	Tarefa planejada, ainda distante de começar.	—
A fazer	Pronta para começar; o início se aproxima ou já chegou.	—
Em andamento	Sendo executada.	sim
Bloqueado	Parada por um impedimento. Registre o motivo no comentário.	sim
Em revisão	Feita, aguardando validação ou aprovação.	sim
Concluído	Entregue. O % vai automaticamente para 100.	—

Toda mudança de status ou de % é registrada com a data no **histórico** da tarefa. É esse histórico que permite desenhar o CFD, comparar follow-ups e medir tempos de ciclo.

Planejado × real

% planejado para hoje

Considera que a tarefa avança de forma linear entre o início e o fim: uma tarefa de 10 dias, no 5º dia, deveria estar em 50%.

% real

É o % concluído informado por você (ou 100% quando concluída). A diferença entre os dois é o **desvio**.

No projeto, os percentuais são **ponderados pela duração**: uma tarefa de 20 dias pesa o dobro de uma de 10. Marcos pesam 1 dia.

$$\text{SPI} = \frac{\%\ \text{real do projeto}}{\%\ \text{planejado para hoje}}$$

1,00 = no prazo · abaixo de 0,95 = atenção · abaixo de 0,85 = crítico

Glossário rápido

TERMO	SIGNIFICADO NO APP

Marco ◆	Evento de um dia (aprovação, go-live). Aparece como losango na timeline.
Dependência	Regra que liga duas tarefas: uma só pode começar (ou terminar) depois de outra. Ver capítulo 4.
Caminho crítico	Sequência de tarefas sem folga: qualquer atraso nelas atrasa o fim do projeto.
Folga	Quantos dias uma tarefa pode atrasar sem empurrar o fim planejado do projeto.
WIP	*Work in progress*: tarefas em andamento, em revisão ou bloqueadas ao mesmo tempo.
Vazão	Quantas tarefas são concluídas por período (semana ou 14 dias).
Tempo de ciclo	Dias entre o início da execução e a conclusão de uma tarefa.
Lead time	Dias entre o cadastro da tarefa e a sua conclusão.
CFD	Diagrama de fluxo cumulativo: quantas tarefas estavam em cada status, dia a dia.
Previsão de término	Data em que o projeto chega a 100% se mantiver o ritmo de avanço das últimas semanas (até 4).

CAPÍTULO 04

Montando a timeline

A timeline é a base de tudo: quanto melhor o cadastro das tarefas, datas e dependências, mais precisos ficam os insights e alertas.

Cadastrar uma tarefa

Clique em **+ Tarefa** (na Timeline ou em Tarefas) ou clique numa tarefa existente para editá-la.

CAMPO	DICA
Título	Verbo + entrega: "Homologar regras fiscais".
Fase / entrega	Agrupa as tarefas na timeline e no progresso por fase.
Responsável	Uma pessoa. Sem responsável gera alerta.
Início e Fim	Datas planejadas. O fim define o atraso.
Status e %	Situação atual (ver capítulo 3).
Comentário	Vai para o histórico com a data de hoje.
Marco	Marque para eventos de um dia.
Dependências	Predecessoras, tipo e defasagem.

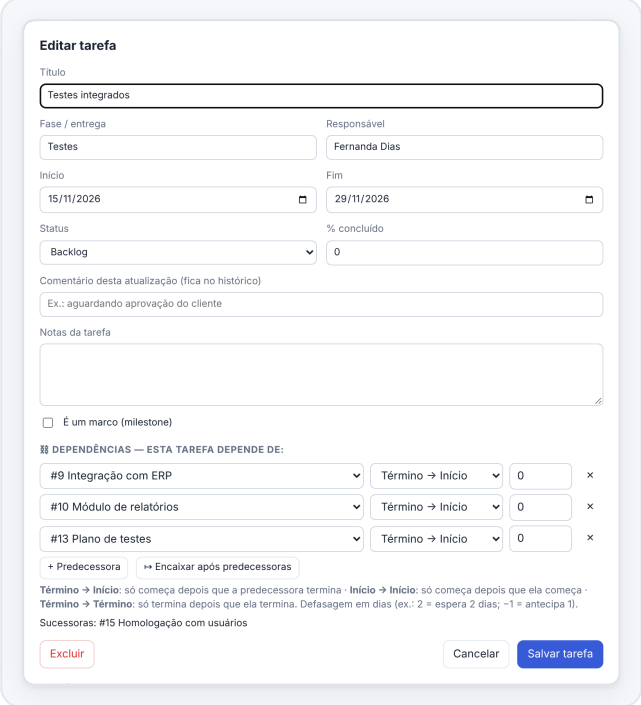


Figura 3 — Edição de uma tarefa, com três predecessoras configuradas.

Dependências entre tarefas

Na seção ⛓ **Dependências** da tarefa, clique em **+ Predecessora**, escolha a tarefa, o tipo de vínculo e, se quiser, uma defasagem em dias.

TIPO	SIGLA	REGRA	EXEMPLO
Término → Início	TI / FS	Só começa depois que a predecessora termina. É o padrão.	Testes só depois do desenvolvimento.
Início → Início	II / SS	Só começa depois que a predecessora começa.	Migração começa 3 dias após a integração.
Término → Término	TT / FF	Só termina depois que a predecessora termina.	Documentação termina junto com o build.

Defasagem desloca a regra: **+2** significa esperar 2 dias; **−1** permite antecipar 1 dia.

> **O app cuida da consistência**
> Não é possível criar dependências em ciclo (A depende de B, que depende de A). O botão **↦ Encaixar após predecessoras** move o início para a primeira data permitida, mantendo a duração. E, ao salvar, se alguma tarefa ficar com data em conflito, o app oferece **reagendar** as afetadas.

Importar a timeline de uma planilha

Em **Importar**, cole as linhas copiadas do Excel ou do Google Sheets (ou um CSV). O cabeçalho é ignorado automaticamente e o app mostra quantas tarefas reconheceu antes de importar.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tarefa	Fase	Responsável	Início	Fim	Status*	%*	Marco*	Predecessoras*

* opcionais. Datas em dd/mm/aaaa ou aaaa-mm-dd. O status aceita variações (“concluído”, “feito”, “em andamento”, “bloqueado”...). Marco: “sim” ou “x”.



Figura 4 — Importação colando três linhas do Excel, com marco e predecessoras.

Predecessoras na planilha (estilo MS Project)

ESCREVA	SIGNIFICA
`2`	Depende da 2ª tarefa da lista colada (Término → Início).
`2TI+3`	Término → Início com 3 dias de espera.

`4II`	Início → Início com a 4ª tarefa.
`5TT-1`	Término → Término, podendo terminar 1 dia antes.
`#12`	Tarefa que já existe no projeto, pelo número dela.
`1;3`	Várias predecessoras: separe com `;`, `,` ou `|`.

★ **Do app para o Excel e de volta**

Exportar CSV (aba Tarefas) gera a planilha já no formato de importação, com as predecessoras. Dá para ajustar no Excel e importar de novo.

CAPÍTULO 05

Timeline (Gantt)

A timeline mostra o cronograma inteiro em uma imagem: o que está planejado, o que já foi feito, o que atrasou e como as tarefas se encadeiam.

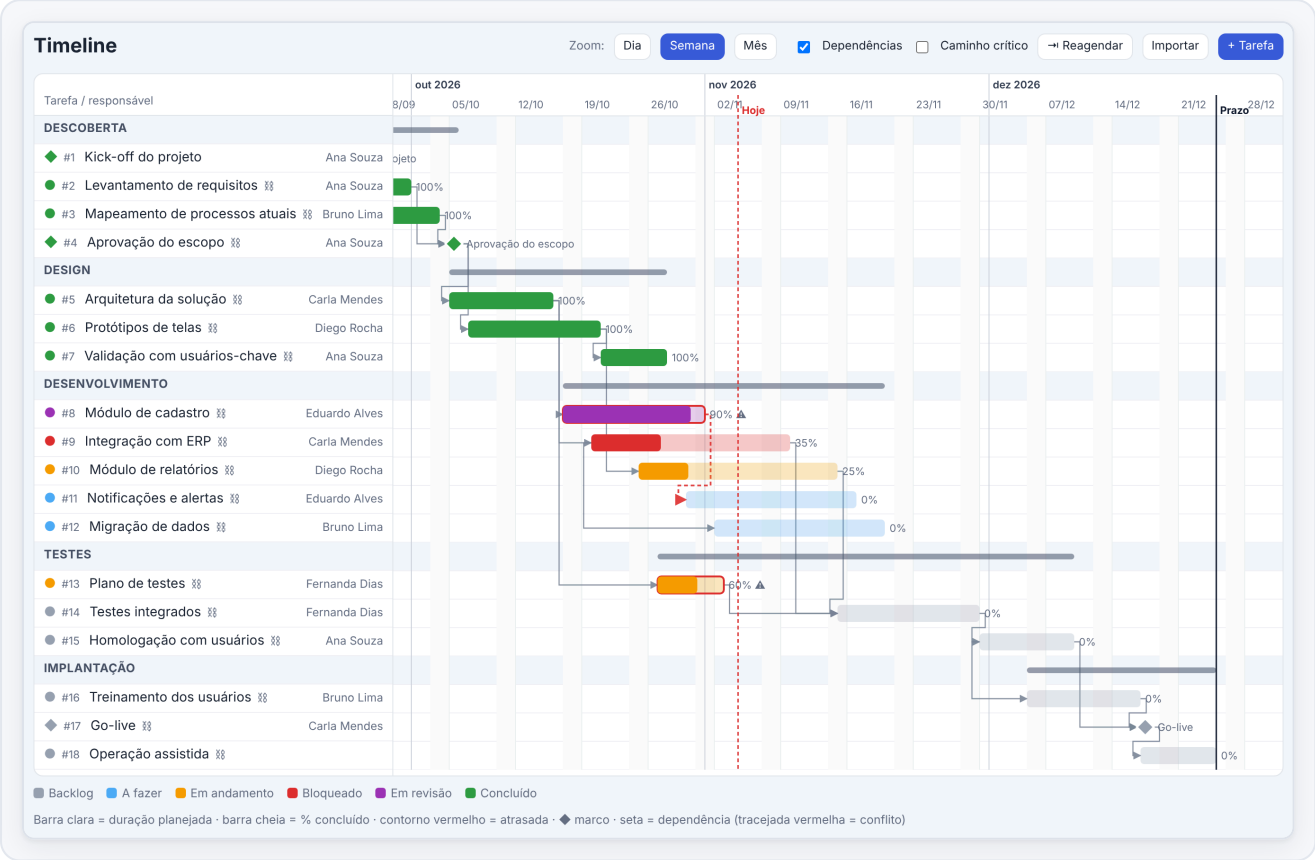


Figura 5 — Timeline do projeto de exemplo, com as dependências visíveis.

Como ler

- **Barra clara** — duração planejada da tarefa.
- **Barra cheia** — parte concluída (% real).
- **Contorno vermelho e ⚠** — tarefa atrasada.
- **Losango** — marco.
- **Linha vermelha tracejada** — hoje.
- **Linha escura** — prazo do projeto.
- **Seta cinza** — dependência.
- **Seta vermelha tracejada** — conflito de datas.

A cor da barra é a do status. A lista à esquerda mostra o número (#), o ícone ⛓ quando a tarefa tem predecessoras e o responsável. Clique numa barra ou no nome para editar. Use **Dia**, **Semana** ou **Mês** para mudar o zoom; o app já abre posicionado em hoje.

Caminho crítico

Marque **Caminho crítico** para destacar, com contorno escuro, as tarefas sem folga; as demais ficam esmaecidas. Elas são onde vale concentrar atenção: um dia de atraso nelas é um dia a mais no projeto.

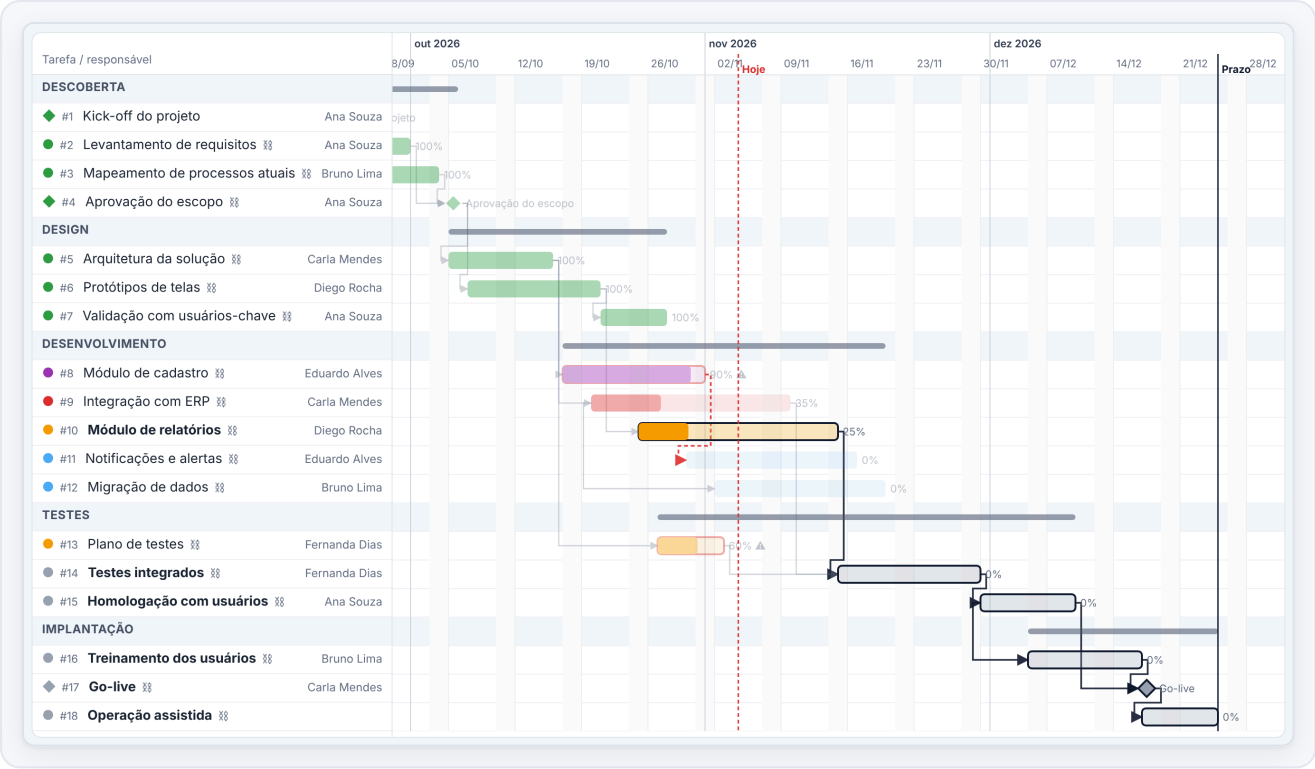


Figura 6 — Caminho crítico destacado: Relatórios → Testes integrados → Homologação → Treinamento → Go-live → Operação.

Reagendar pelas dependências

Quando uma tarefa está planejada para começar antes do que as predecessoras permitem, a seta fica vermelha e surge um alerta de conflito. O botão **⇥ Reagendar** mostra as novas datas antes de aplicar.



Figura 7 — Prévia do reagendamento: a tarefa #11 é empurrada 2 dias.

Regras do reagendamento

Só tarefas **não iniciadas** são movidas, sempre **para frente** e mantendo a duração. Tarefas em andamento não mudam de data. Se o novo plano passar do prazo do projeto, o app avisa antes de aplicar.

CAPÍTULO 06

Lista de tarefas

A aba Tarefas é a visão de planilha: todas as tarefas com datas, dependências, status, % real, % planejado e o desvio entre eles.

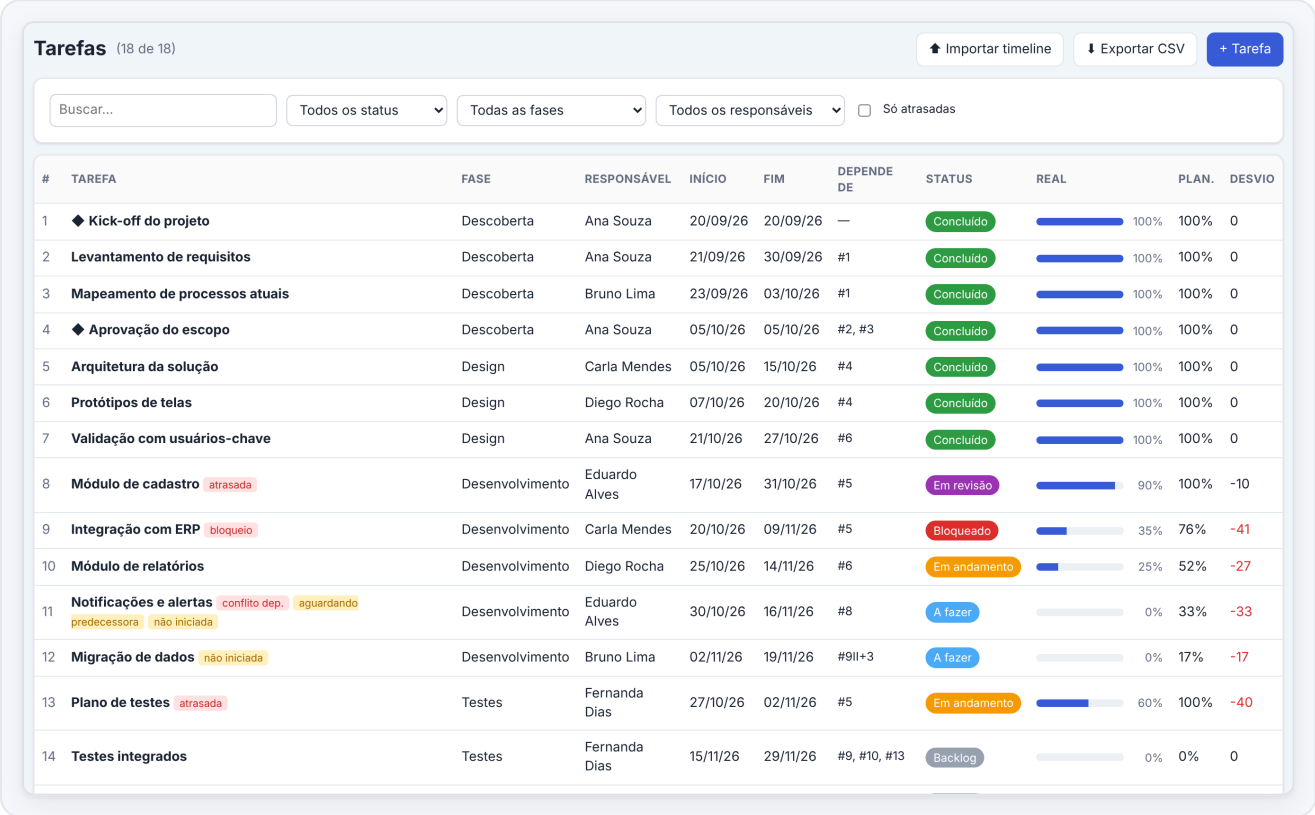


Figura 8 — Lista de tarefas com filtros, dependências e etiquetas de atenção.

Colunas e etiquetas

COLUNA	MOSTRA
#	Número fixo da tarefa
Depende de	Predecessoras (ex.: #9, #6II+3)
Real	% concluído
Plan.	% que deveria estar feito hoje
Desvio	Real − planejado, em pontos (vermelho abaixo de −10)

ETIQUETA	QUANDO APARECE
atrasada	O fim passou e não está concluída
bloqueio	Status Bloqueado
não iniciada	O início passou e ainda não começou
conflito dep.	Data conflita com uma predecessora
aguardando predecessora	Predecessora ainda pendente

Os filtros combinam busca por texto, status, fase, responsável e “Só atrasadas”. Clique numa linha para editar a tarefa.

CAPÍTULO 07

Visão geral

A primeira aba responde, em um minuto, às duas perguntas de qualquer reunião de status: como estamos e vamos cumprir o prazo?

Saúde do projeto

A faixa colorida no topo resume a situação em três níveis, calculados automaticamente:

NÍVEL	QUANDO APARECE
No prazo	SPI de 0,95 ou mais, previsão dentro do prazo e nenhum alerta de alta severidade.
Atenção	SPI abaixo de 0,95, **ou** previsão de término após o prazo, **ou** ao menos um alerta de alta severidade.
Crítico	SPI abaixo de 0,85, **ou** previsão mais de 7 dias após o prazo, **ou** 3 ou mais alertas de alta severidade.

Indicadores

CARTÃO	O QUE MOSTRA
Progresso real	% ponderado concluído, com o % planejado para hoje embaixo.
SPI	Real ÷ planejado. 1,00 = exatamente no plano.
Concluídas	Tarefas entregues sobre o total, com atrasadas e bloqueadas.
WIP	Tarefas ativas agora, comparadas ao limite configurado.
Previsão de término	Data projetada pelo ritmo recente e a diferença para o prazo.
Prazo	Dias restantes e % do tempo já decorrido.

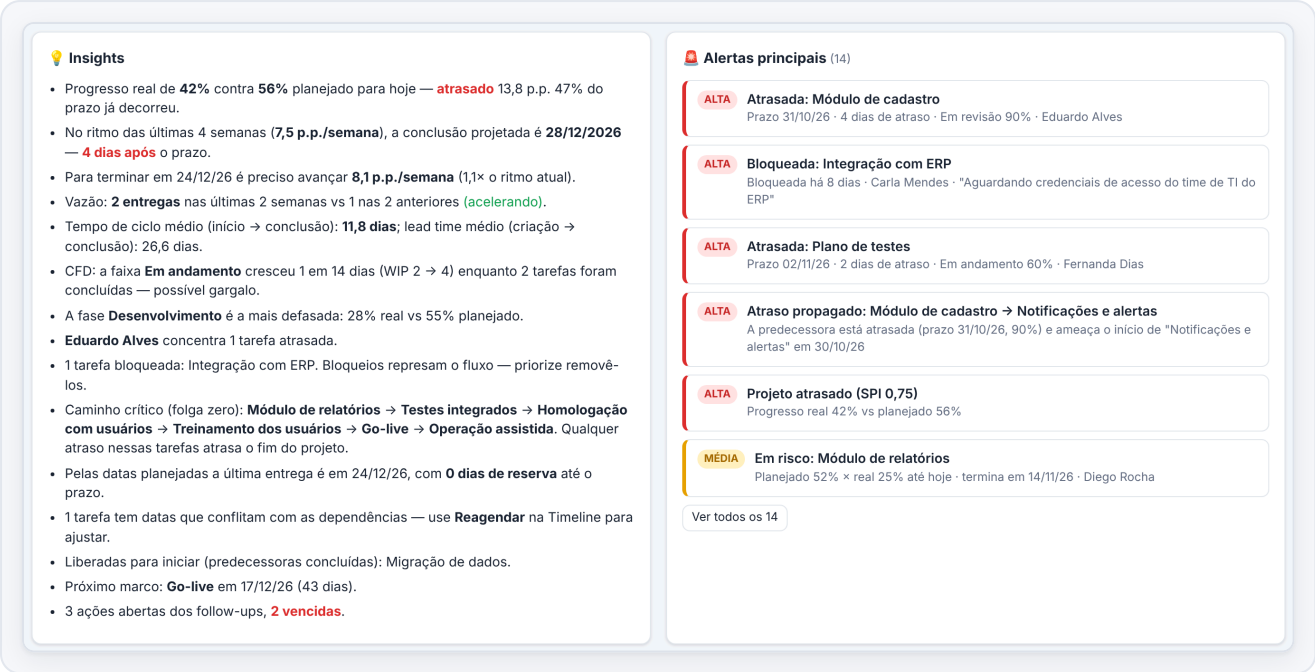


Figura 9 — Insights gerados automaticamente e os seis alertas mais importantes.

Insights: o app lê o projeto por você

Os insights transformam os números em frases. Eles aparecem apenas quando são relevantes e cobrem:

- ✔ Progresso real × planejado e % do prazo decorrido
- ✔ Previsão de término pelo ritmo das últimas semanas
- ✔ Ritmo necessário para cumprir o prazo (× o atual)
- ✔ Vazão das últimas 2 semanas × as 2 anteriores
- ✔ Tempo de ciclo e lead time médios
- ✔ Possível gargalo apontado pelo CFD
- ✔ Fase mais defasada
- ✔ Responsável com mais tarefas atrasadas
- ✔ Tarefas bloqueadas
- ✔ Caminho crítico e dias de reserva até o prazo
- ✔ Conflitos de datas com dependências
- ✔ Tarefas liberadas para iniciar
- ✔ Próximo marco
- ✔ Ações dos follow-ups abertas e vencidas



Figura 10 — Curva S (planejado × real) e o CFD dos últimos 30 dias.



Figura 11 — Progresso por fase (laranja quando mais de 10 pontos atrás do plano), entregas dos próximos 14 dias e carga por responsável.

CAPÍTULO 08

Reuniões de follow-up

A aba Follow-ups é o roteiro da reunião: ela prepara a pauta, registra as atualizações na data da reunião, compara com o encontro anterior e gera a ata.

Conduzindo a reunião, passo a passo

1. **Clique em + Nova.** A reunião é criada com a data de hoje e os participantes da anterior. Ajuste título, data e participantes.
2. **Abra pela pauta sugerida.** Ela lista atrasos, bloqueios, entregas e inícios próximos e as ações pendentes.
3. **Atualize as tarefas** na tabela: status, % e comentário. Tudo é registrado na data da reunião.
4. **Anote** os pontos discutidos e as **decisões** (uma por linha).
5. **Registre as ações**, com responsável e prazo, e marque as pendentes de reuniões anteriores que foram concluídas.
6. **Gere a ata ou o PDF** e salve o arquivo.

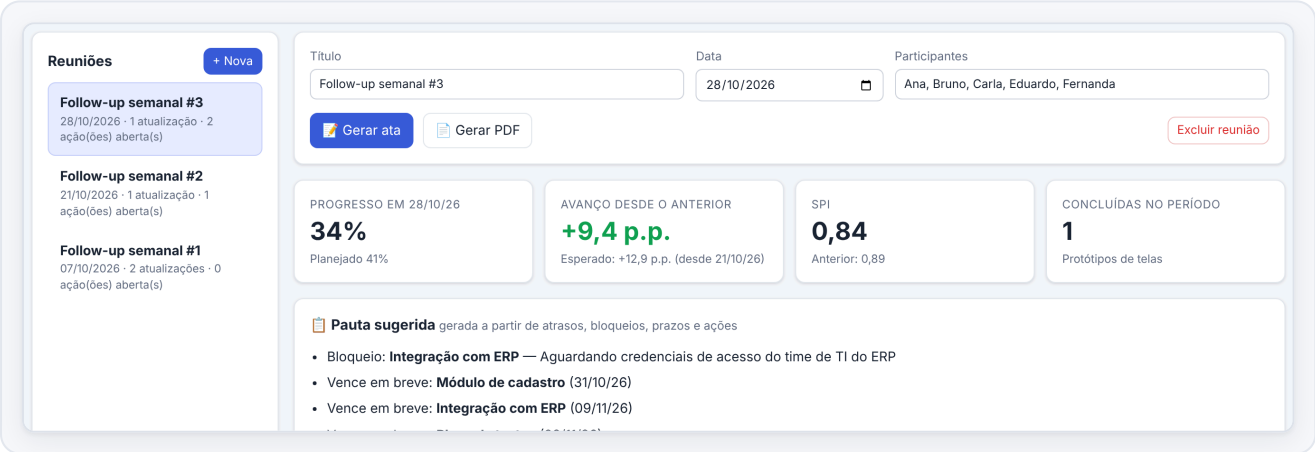


Figura 12 — Lista de reuniões, dados da reunião e a comparação com o follow-up anterior.

Os quatro cartões mostram o **progresso na data da reunião**, o **avanço desde o follow-up anterior** (comparado ao avanço esperado), o **SPI** atual e o anterior, e as **tarefas concluídas no período**.

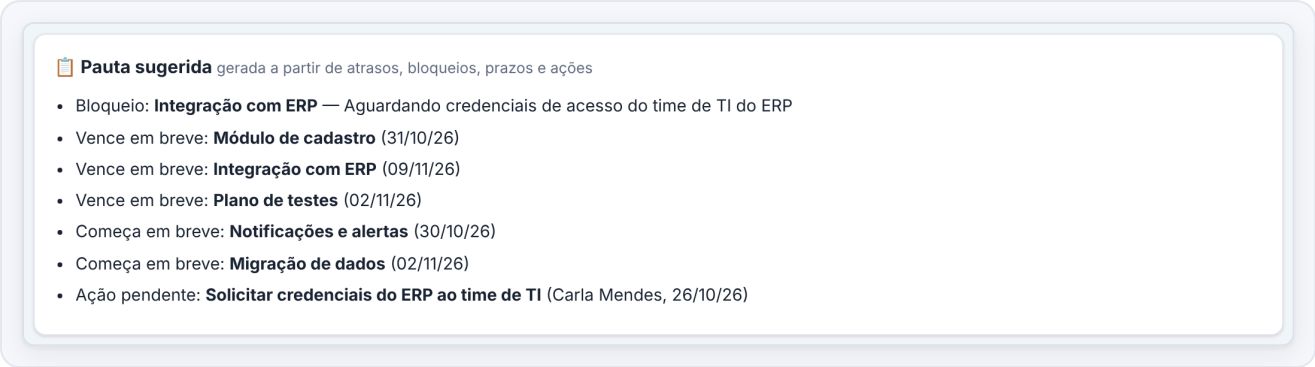


Figura 13 — Pauta sugerida, montada a partir dos dados do projeto.

Atualização das tarefas

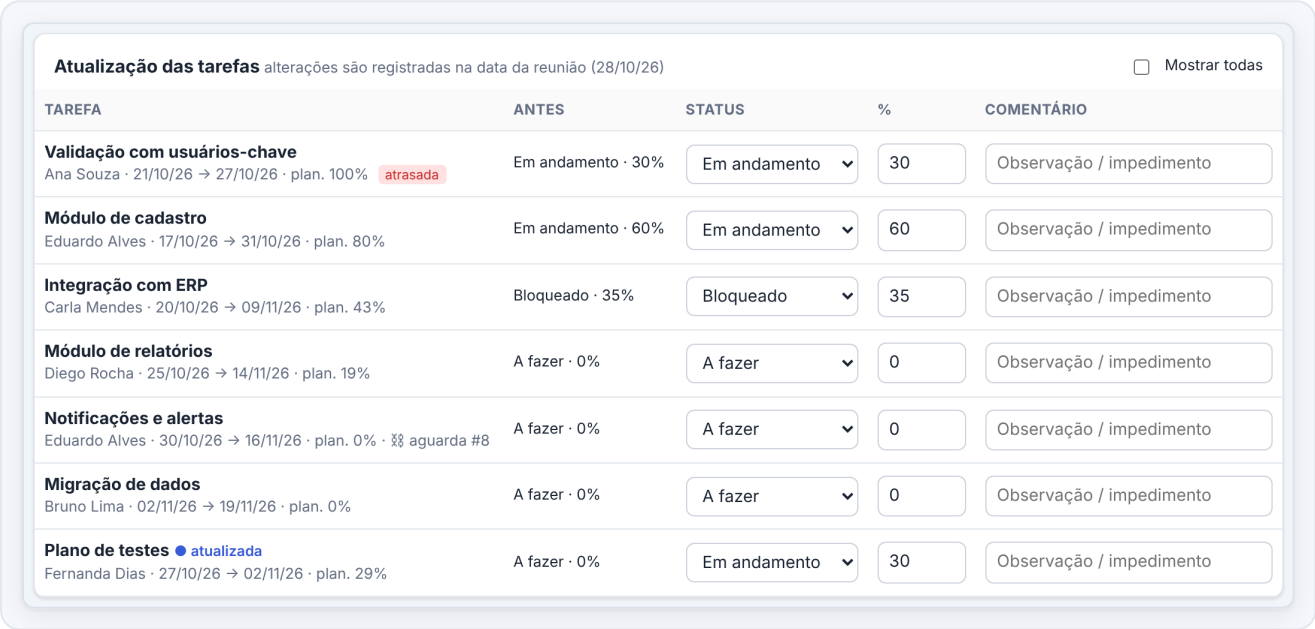


Figura 14 — Tabela de atualização: a coluna “Antes” mostra a situação na véspera da reunião.

Por padrão aparecem as tarefas ativas e as que começam nas próximas duas semanas; marque **Mostrar todas** para ver o resto. Tarefas alteradas ganham a marca ● atualizada, e “⛓ aguarda #8” indica uma predecessora pendente.

> **Registrar uma reunião passada**
> As alterações valem para a **data da reunião**, não para hoje. Assim é possível lançar um follow-up que ficou atrasado sem distorcer o CFD e os históricos. Se mudar a data da reunião, os registros dela são movidos junto.

Decisões e ações



Figura 15 — Anotações, decisões e ações, incluindo as pendentes de reuniões anteriores.

Ações com prazo vencido viram alerta até serem marcadas como concluídas, em qualquer reunião.

Ata e PDF da reunião

📝 **Gerar ata** monta um texto pronto para colar no e-mail ou no Teams: situação geral, atualizações (antes → depois), anotações, decisões, ações e alertas. Use **Copiar** ou **Baixar .txt**.

📄 **Gerar PDF** abre a impressão do navegador com um relatório completo: indicadores da reunião, insights, pauta, atualizações, situação das tarefas, decisões, ações, alertas e, em página nova, a aba CFD & Métricas. Escolha **Salvar como PDF**.

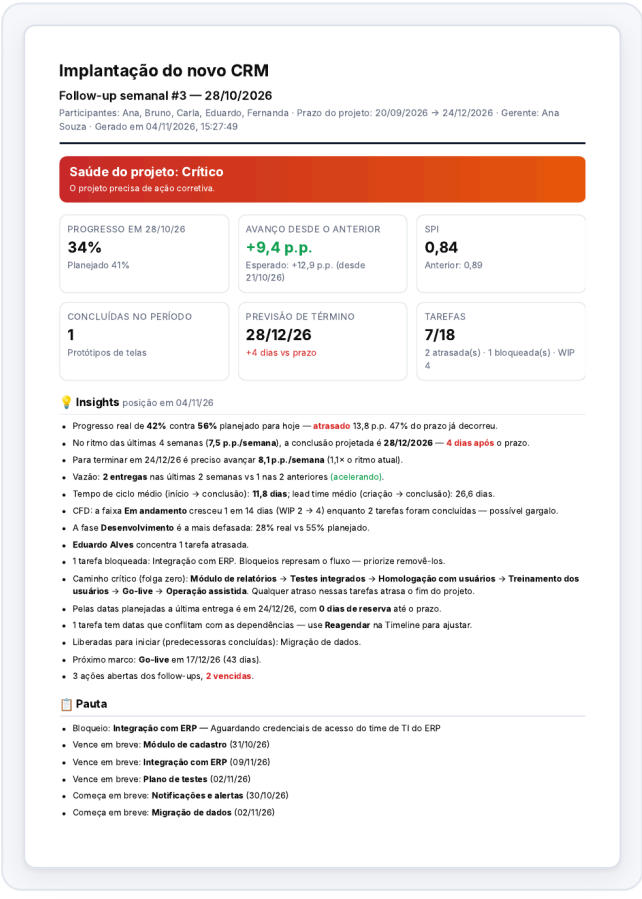


Figura 16 — Primeira página do PDF gerado pelo follow-up.

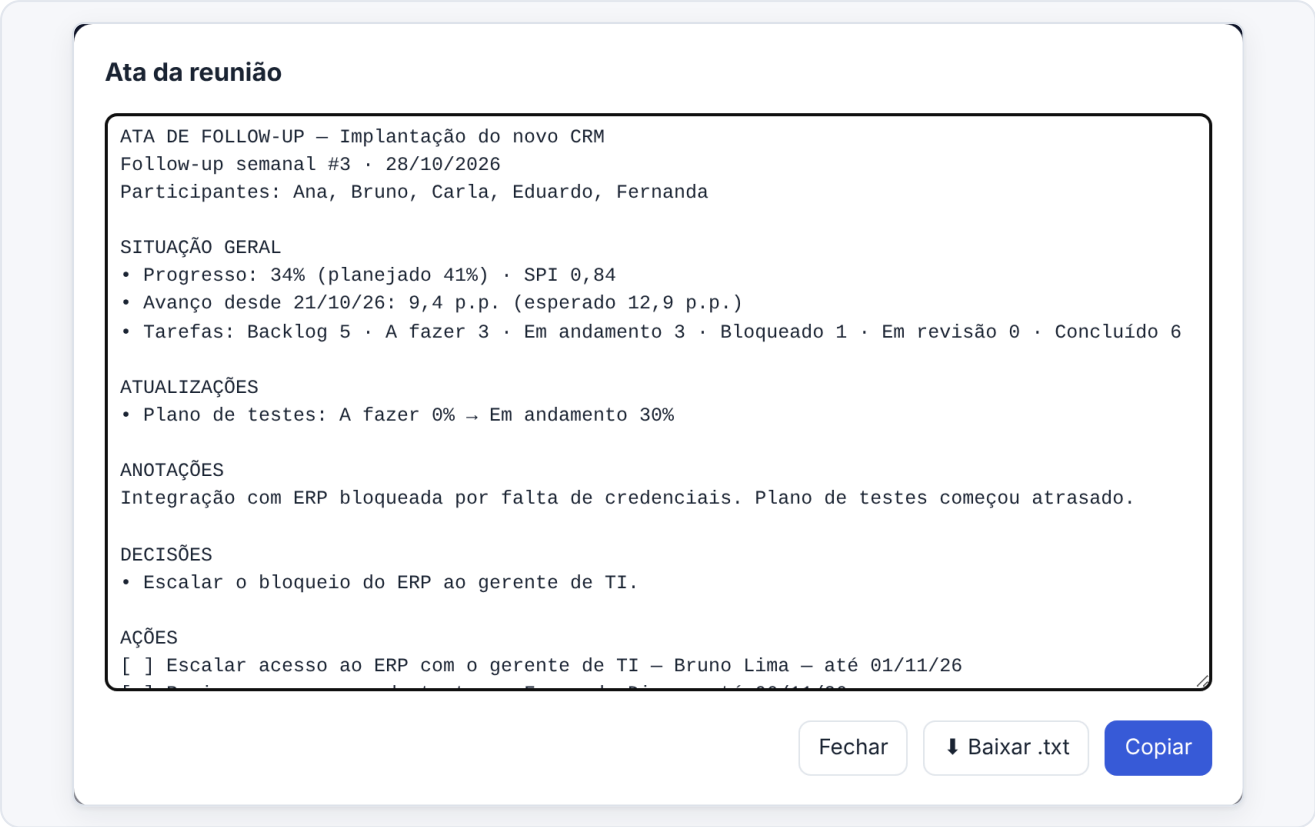


Figura 17 — Ata gerada automaticamente.

CAPÍTULO 09

CFD & Métricas de fluxo

Enquanto a timeline mostra o plano, o CFD mostra o fluxo real do trabalho. É a melhor ferramenta para descobrir onde as tarefas estão se acumulando.

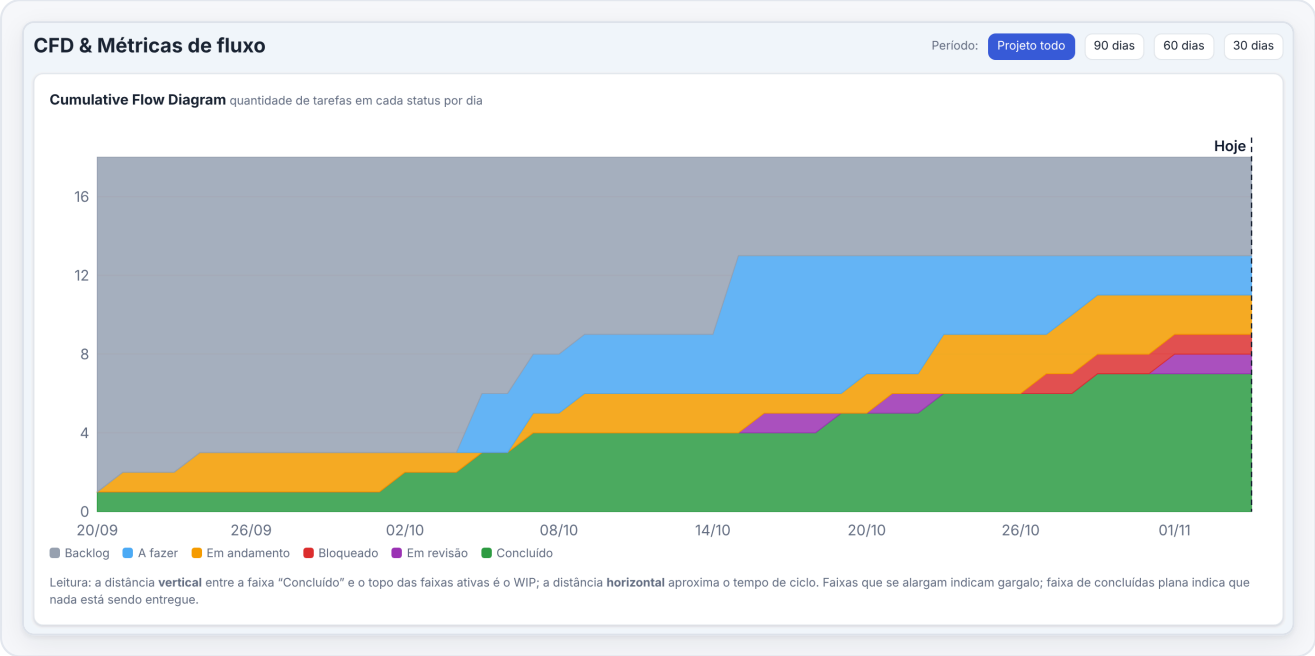


Figura 18 — CFD do projeto inteiro. Ao passar o mouse, o app mostra quantas tarefas havia em cada status naquele dia.

Como ler o CFD em 4 olhares

1 Faixa verde subindo
Entregas acontecendo. Faixa verde plana por muito tempo = nada sendo concluído.

2 Espessura das faixas do meio
A soma de laranja, vermelho e roxo é o WIP. Se engrossa, o trabalho está acumulando.

3 Qual faixa engrossa
Aponta o gargalo: revisão (roxo) que cresce indica aprovação lenta; vermelho, impedimentos.

4 Distância horizontal
Entre o início de uma faixa e a chegada no verde, aproxima o tempo de ciclo.

Escolha o período em **Projeto todo**, **90**, **60** ou **30 dias**.

Métricas de fluxo




Figura 19 — Cartões de métricas de fluxo.

MÉTRICA	COMO É CALCULADA	COMO USAR
WIP atual	Em andamento + em revisão + bloqueadas.	Compare ao limite; WIP alto alonga tudo.
Vazão (14 dias)	Tarefas concluídas nos últimos 14 dias × 14 anteriores.	Mostra se o time está acelerando.
Tempo de ciclo	Média de dias do início à conclusão.	Base para prometer prazos.
Lead time	Média de dias do cadastro à conclusão.	Tempo total percebido pelo cliente.
Chegada × saída	Iniciadas × concluídas por semana (4 semanas).	Se entra mais do que sai, o WIP cresce.
Lei de Little	WIP ÷ vazão diária.	Ciclo esperado se nada mudar.



Figura 20 — Curva S do projeto e vazão semanal.

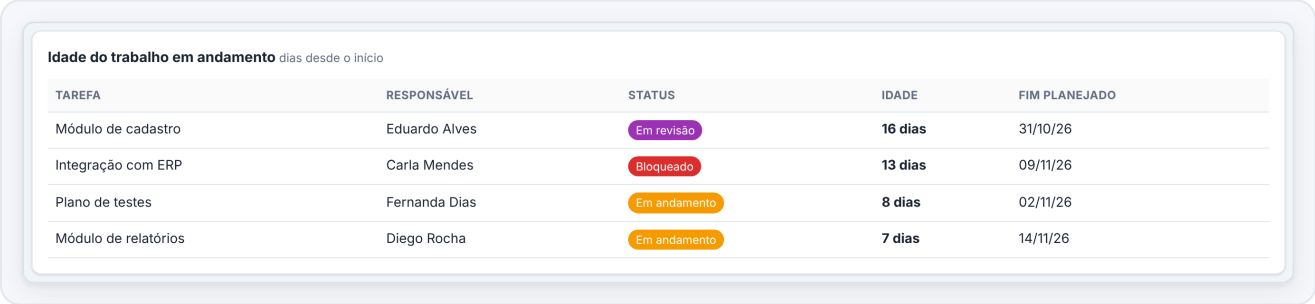


Figura 21 — Idade do trabalho em andamento: tarefas paradas há muito tempo saltam aos olhos.

Tarefas envelhecendo

Na tabela de idade, tarefas com mais de 1,5× o tempo de ciclo médio aparecem em vermelho. São candidatas a serem quebradas, priorizadas ou desbloqueadas.

CAPÍTULO 10

Alertas

Os alertas são a lista de “o que precisa de atenção agora”. São recalculados a cada alteração e organizados em três níveis de severidade.

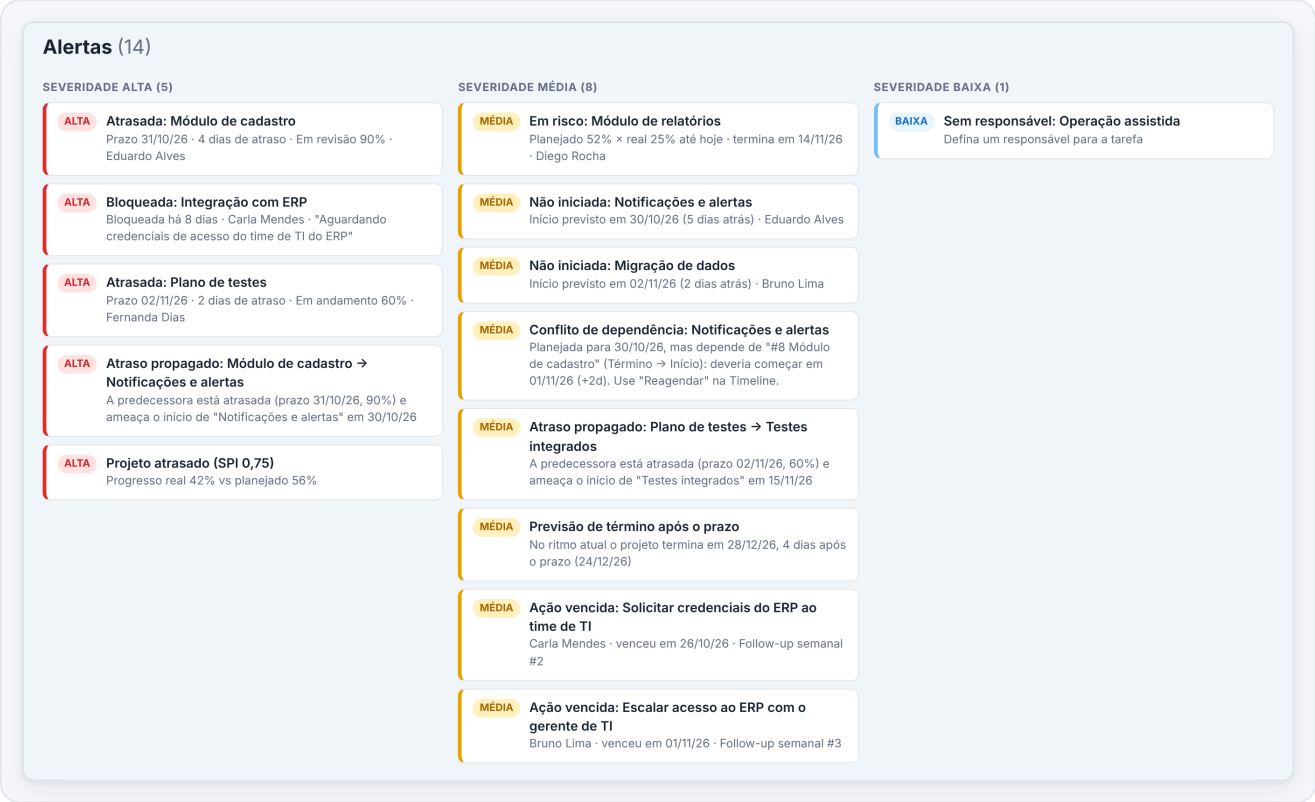


Figura 22 — Aba Alertas do projeto de exemplo, por severidade. O número em vermelho na aba conta os de severidade alta.

ALERTA	DISPARA QUANDO	SEVERIDADE
Atrasada	O fim planejado passou e a tarefa não foi concluída.	ALTA
Bloqueada	Tarefa no status Bloqueado.	MÉDIA → ALTA após 3 dias
Não iniciada	O início passou e ela segue em Backlog ou A fazer.	MÉDIA
Em risco	Real 25 pontos ou mais abaixo do planejado para hoje.	MÉDIA
Sem atualização	Em andamento sem registro há 7 dias ou mais (configurável).	MÉDIA
Conflito de dependência	Planejada para começar antes do que a predecessora permite.	MÉDIA
Atraso propagado	A predecessora está atrasada e ameaça o início da sucessora.	ALTA se começa em até 7 dias
Iniciada antes da predecessora	Começou sem a predecessora (Término → Início) terminar.	BAIXA

WIP acima do limite	Tarefas ativas acima do limite configurado.	MÉDIA
Projeto atrasado	SPI abaixo de 0,95 (média) ou de 0,85 (alta).	MÉDIA / ALTA
Previsão após o prazo	Término projetado depois do prazo (alta se mais de 7 dias).	MÉDIA / ALTA
Sem avanço recente	Nenhum progresso nas últimas semanas: não há como projetar.	ALTA
Marco próximo	Marco não concluído nos próximos 7 dias.	MÉDIA
Ação vencida	Ação de follow-up com prazo vencido e não concluída.	MÉDIA
Sobrecarga	Uma pessoa com 3 ou mais tarefas ativas ao mesmo tempo.	BAIXA
Sem responsável	Tarefa sem responsável definido.	BAIXA
Sem follow-up recente	Nenhuma reunião registrada há mais de 14 dias.	BAIXA

Do alerta à ação

Clique em um alerta de tarefa para abri-la e corrigir a causa: atualizar o status, renegociar a data, registrar o impedimento ou reagendar. O alerta some sozinho quando a situação é resolvida.

CAPÍTULO 11

Configurações do projeto

A aba Projeto guarda os dados básicos, os limites usados nos alertas e as ferramentas de exportação e manutenção.

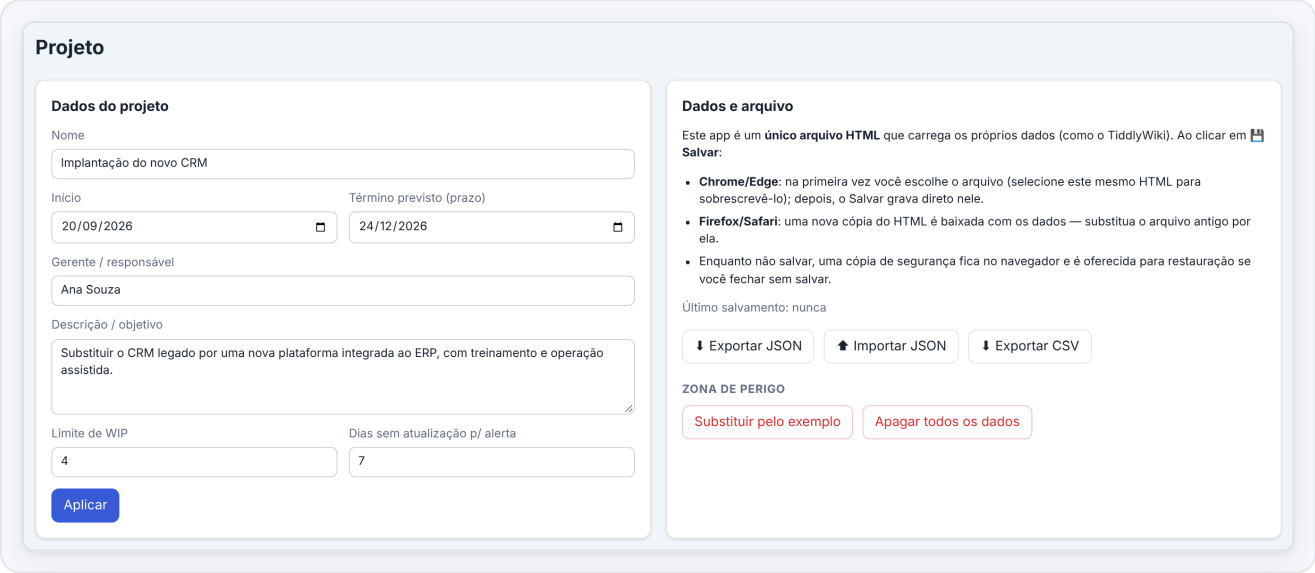


Figura 23 — Aba Projeto: dados, limites e ferramentas de dados.

ITEM	PARA QUE SERVE
Nome, início, término e gerente	Aparecem no cabeçalho e nos relatórios. O término é o prazo usado em SPI, previsão e alertas.
Descrição / objetivo	Contexto do projeto para quem abrir o arquivo.
Limite de WIP	Quantas tarefas ativas são aceitáveis ao mesmo tempo (alerta e insight do CFD).
Dias sem atualização	Depois de quantos dias uma tarefa em andamento sem registro gera alerta.
Exportar / Importar JSON	Cópia completa dos dados para backup ou para levar a outro arquivo.
Exportar CSV	Planilha das tarefas no formato de importação.
Zona de perigo	Substituir pelo exemplo ou apagar tudo. Só se torna definitivo depois de salvar.

CAPÍTULO 12

Salvar, compartilhar e proteger os dados

O app funciona como o TiddlyWiki: os dados vivem dentro do próprio arquivo HTML. Salvar é regravar o arquivo com os dados atualizados.

Como salvar

Edge e Chrome

1. Clique em 💾 **Salvar** ou Ctrl + S.
2. Na primeira vez, selecione **este mesmo arquivo** e confirme a substituição.
3. Pronto: os próximos salvamentos gravam direto, sem perguntar.

Salvar como... grava em outro arquivo, por exemplo, uma versão por mês.

Firefox e Safari

Esses navegadores não permitem gravar no arquivo. O Salvar **baixa uma cópia atualizada** do HTML: substitua o arquivo antigo por ela, mantendo o nome.



Figura 24 — Com alterações pendentes, o cabeçalho avisa "● Alterações não salvas".

Se tentar fechar a aba com alterações pendentes, o navegador pede confirmação.

> **Rede de segurança automática**
> Enquanto você não salva, o app guarda uma cópia das alterações no navegador. Se fechar sem salvar, na próxima abertura aparece o aviso "Há alterações não salvas de uma sessão anterior", com **Restaurar** ou **Descartar**. Para backups definitivos, use **Exportar JSON**.

Trava de salvamento no SharePoint e OneDrive

Para evitar que duas pessoas sobrescrevam o mesmo arquivo ou que versões entrem em conflito na sincronização, o app **bloqueia o salvamento** quando detecta que foi aberto:

- ✔ pelo navegador, a partir do SharePoint, OneDrive ou do visualizador do Office Online;
- ✔ dentro de uma pré-visualização do SharePoint ou do Teams;
- ✔ de uma pasta sincronizada no computador ("OneDrive - Empresa", "SharePoint", "... - Documentos").



Figura 25 — Faixa exibida quando o arquivo é aberto pelo SharePoint: o botão vira "🔒 Salvar bloqueado".

Para atualizar um projeto que está no SharePoint

1. Baixe o arquivo para uma pasta local, fora das pastas sincronizadas.
2. Abra a cópia local, faça as alterações e salve.
3. Envie a nova versão ao SharePoint; o histórico de versões da biblioteca é preservado.

Se já tiver alterado algo na tela bloqueada, use **Baixar cópia local** para não perder o trabalho.



Figura 26 — Janela exibida ao tentar salvar com a trava ativa.

> ★ **O PDF continua liberado**
> Gerar ata e gerar o PDF do follow-up funcionam normalmente mesmo com a trava, porque não alteram o arquivo.

CAPÍTULO 13

Rotina recomendada

Quinze minutos antes e alguns minutos depois de cada follow-up bastam para manter o projeto sob controle.

Antes da reunião

- Abra a **Visão geral**: saúde, SPI e previsão.
- Leia os **insights** e os **alertas de severidade alta**.
- Confira o **CFD**: alguma faixa engrossando?
- Na **Timeline**, veja o caminho crítico e resolva conflitos com **Reagendar**.
- Crie a reunião em **Follow-ups → + Nova**.

Durante

- Siga a **pauta sugerida**.
- Atualize status, % e comentários de cada tarefa ativa.
- Registre impedimentos como **Bloqueado**, com o motivo.
- Anote decisões e crie ações com responsável e prazo.
- Marque as ações anteriores concluídas.

Depois

- **Salve** o arquivo.
- Gere a **ata** e envie aos participantes.
- Gere o **PDF** para patrocinadores e arquivo.
- Revise os alertas que restaram.
- De tempos em tempos, **Exporte JSON** como backup.

Boas práticas

PRÁTICA	POR QUÊ
Tarefas de 3 a 15 dias	Tarefas longas escondem atrasos; muito curtas viram microgestão.
Um responsável por tarefa	Deixa claro quem atualiza e responde pelos alertas.
Atualizar pelo menos semanalmente	O CFD, a previsão e os alertas dependem do histórico.
Respeitar o limite de WIP	Menos tarefas em paralelo = entregas mais rápidas e previsíveis.
Usar dependências reais	Só ligue o que realmente depende; o caminho crítico fica fiel.
Registrar o motivo dos bloqueios	O comentário aparece na pauta, nos alertas e na ata.

CAPÍTULO 14

Perguntas frequentes

Respostas rápidas para as dúvidas e situações mais comuns.

Reabri o arquivo e os dados sumiram.

O último Salvar provavelmente gravou em outro arquivo (outra pasta ou outro nome) ou baixou uma cópia nova (Firefox/Safari). Procure o arquivo mais recente; se o app oferecer **Restaurar**, use-o e salve.

O botão diz "🔒 Salvar bloqueado".

O arquivo foi aberto do SharePoint/OneDrive ou de uma pasta sincronizada. Siga o capítulo 12: baixe uma cópia local, edite, salve e envie a nova versão.

O Salvar baixou um arquivo com "(1)" no nome.

O navegador não permite gravação direta. Substitua o original por esse arquivo, mantendo o nome, ou use Edge/Chrome.

A previsão de término mostra "—".

Não houve avanço registrado nas últimas semanas, então não há ritmo para projetar. Atualize o % das tarefas em andamento.

Uma tarefa aparece com seta vermelha tracejada.

Ela está planejada para começar antes do que a predecessora permite. Use ⇥| **Reagendar** ou ajuste as datas/dependência.

Não consigo escolher uma tarefa como predecessora.

Ela depende, direta ou indiretamente, da tarefa que você está editando; o vínculo criaria um ciclo.

Atualizei uma tarefa no follow-up e o CFD de hoje não mudou.

As alterações do follow-up valem para a data da reunião. Se a reunião é de uma data passada, o efeito aparece naquele dia.

O PDF do follow-up saiu sem cores.

Na janela de impressão, ative "Gráficos de plano de fundo" (Mais definições) e escolha "Salvar como PDF".

A importação reconheceu menos tarefas do que colei.

Linhas sem título ou com datas inválidas são ignoradas; a prévia lista as linhas com erro. Confira o formato das datas.

Quero recomeçar do zero.

Em **Projeto → Apagar todos os dados** e salve. Ou mantenha o arquivo atual como histórico e use uma cópia nova do app.

