Implantação do novo CRM

Follow-up semanal #3 — 05/11/2026

Participantes: Ana, Bruno, Carla, Eduardo, Fernanda · Prazo do projeto: 28/09/2026 → 01/01/2027 · Gerente: Ana Souza · Gerado em 12/11/2026, 18:51:54

Saúde do projeto: Crítico
O projeto precisa de ação corretiva.

PROGRESSO EM 05/11/26	AVANÇO DESDE O ANTERIOR	SPI
34%	**+9,4 p.p.**	**0,84**
Planejado 41%	Esperado: +12,9 p.p. (desde 29/10/26)	Anterior: 0,89

CONCLUÍDAS NO PERÍODO	PREVISÃO DE TÉRMINO	TAREFAS
1	**05/01/27**	**7/18**
Protótipos de telas	+4 dias vs prazo	2 atrasada(s) · 1 bloqueada(s) · WIP 4

💡 Insights posição em 12/11/26

- Progresso real de **42%** contra **56%** planejado para hoje — **atrasado** 13,8 p.p. 47% do prazo já decorreu.
- No ritmo das últimas 4 semanas (**7,5 p.p./semana**), a conclusão projetada é **05/01/2027** — **4 dias após** o prazo.
- Para terminar em 01/01/27 é preciso avançar **8,1 p.p./semana** (1,1× o ritmo atual).
- Vazão: **2 entregas** nas últimas 2 semanas vs 1 nas 2 anteriores (acelerando).
- Tempo de ciclo médio (início → conclusão): **11,8 dias**; lead time médio (criação → conclusão): 26,6 dias.
- CFD: a faixa **Em andamento** cresceu 1 em 14 dias (WIP 2 → 4) enquanto 2 tarefas foram concluídas — possível gargalo.
- A fase **Desenvolvimento** é a mais defasada: 28% real vs 55% planejado.
- **Eduardo Alves** concentra 1 tarefa atrasada.
- 1 tarefa bloqueada: Integração com ERP. Bloqueios represam o fluxo — priorize removê-los.
- Caminho crítico (folga zero): **Módulo de relatórios** → **Testes integrados** → **Homologação com usuários** → **Treinamento dos usuários** → **Go-live** → **Operação assistida**. Qualquer atraso nessas tarefas atrasa o fim do projeto.
- Pelas datas planejadas a última entrega é em 01/01/27, com **0 dias de reserva** até o prazo.
- 1 tarefa tem datas que conflitam com as dependências — use **Reagendar** na Timeline para ajustar.
- Liberadas para iniciar (predecessoras concluídas): Migração de dados.
- Próximo marco: **Go-live** em 25/12/26 (43 dias).
- 3 ações abertas dos follow-ups, **2 vencidas**.

📋 Pauta

- Bloqueio: **Integração com ERP** — Aguardando credenciais de acesso do time de TI do ERP
- Vence em breve: **Módulo de cadastro** (08/11/26)
- Vence em breve: **Integração com ERP** (17/11/26)
- Vence em breve: **Plano de testes** (10/11/26)
- Começa em breve: **Notificações e alertas** (07/11/26)
- Começa em breve: **Migração de dados** (10/11/26)
- Ação pendente: **Solicitar credenciais do ERP ao time de TI** (Carla Mendes, 03/11/26)

🔄 Atualizações registradas na reunião

#	TAREFA	RESPONSÁVEL	ANTES	DEPOIS	COMENTÁRIO
13	Plano de testes	Fernanda Dias	A fazer · 0%	Em andamento 30%	

📌 Situação das tarefas em acompanhamento

#	TAREFA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FIM	STATUS	REAL	PLAN.	DEPENDE DE
7	Validação com usuários-chave atrasada	Ana Souza	29/10/26	04/11/26	Em andamento	30%	100%	#6
8	Módulo de cadastro	Eduardo Alves	25/10/26	08/11/26	Em andamento	60%	80%	#5
9	Integração com ERP	Carla Mendes	28/10/26	17/11/26	Bloqueado	35%	43%	#5
10	Módulo de relatórios	Diego Rocha	02/11/26	22/11/26	A fazer	0%	19%	#6
11	Notificações e alertas	Eduardo Alves	07/11/26	24/11/26	A fazer	0%	0%	#8
12	Migração de dados	Bruno Lima	10/11/26	27/11/26	A fazer	0%	0%	#9II+3
13	Plano de testes	Fernanda Dias	04/11/26	10/11/26	Em andamento	30%	29%	#5

📝 Anotações

Integração com ERP bloqueada por falta de credenciais. Plano de testes começou atrasado.

✅ Decisões

- Escalar o bloqueio do ERP ao gerente de TI.

🎯 Ações

	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
☐	Escalar acesso ao ERP com o gerente de TI	Bruno Lima	09/11/26
☐	Revisar cronograma de testes	Fernanda Dias	14/11/26
☐	Solicitar credenciais do ERP ao time de TI (pendente de Follow-up semanal #2)	Carla Mendes	03/11/26

🚨 Alertas atuais posição em 12/11/26

ALTA **Atrasada: Módulo de cadastro**
Prazo 08/11/26 · 4 dias de atraso · Em revisão 90% · Eduardo Alves

ALTA **Bloqueada: Integração com ERP**
Bloqueada há 8 dias · Carla Mendes · "Aguardando credenciais de acesso do time de TI do ERP"

ALTA **Atrasada: Plano de testes**
Prazo 10/11/26 · 2 dias de atraso · Em andamento 60% · Fernanda Dias

ALTA **Atraso propagado: Módulo de cadastro → Notificações e alertas**
A predecessora está atrasada (prazo 08/11/26, 90%) e ameaça o início de "Notificações e alertas" em 07/11/26

ALTA **Projeto atrasado (SPI 0,75)**
Progresso real 42% vs planejado 56%

MÉDIA **Em risco: Módulo de relatórios**
Planejado 52% × real 25% até hoje · termina em 22/11/26 · Diego Rocha

MÉDIA **Não iniciada: Notificações e alertas**
Início previsto em 07/11/26 (5 dias atrás) · Eduardo Alves

MÉDIA **Não iniciada: Migração de dados**
Início previsto em 10/11/26 (2 dias atrás) · Bruno Lima

MÉDIA **Conflito de dependência: Notificações e alertas**
Planejada para 07/11/26, mas depende de "#8 Módulo de cadastro" (Término → Início): deveria começar em 09/11/26 (+2d). Use "Reagendar" na Timeline.

MÉDIA **Atraso propagado: Plano de testes → Testes integrados**
A predecessora está atrasada (prazo 10/11/26, 60%) e ameaça o início de "Testes integrados" em 23/11/26

MÉDIA **Previsão de término após o prazo**
No ritmo atual o projeto termina em 05/01/27, 4 dias após o prazo (01/01/27)


MÉDIA **Ação vencida: Solicitar credenciais do ERP ao time de TI**
Carla Mendes · venceu em 03/11/26 · Follow-up semanal #2

MÉDIA **Ação vencida: Escalar acesso ao ERP com o gerente de TI**
Bruno Lima · venceu em 09/11/26 · Follow-up semanal #3

CFD & Métricas

Implantação do novo CRM · posição em 12/11/2026

Cumulative Flow Diagram quantidade de tarefas em cada status por dia

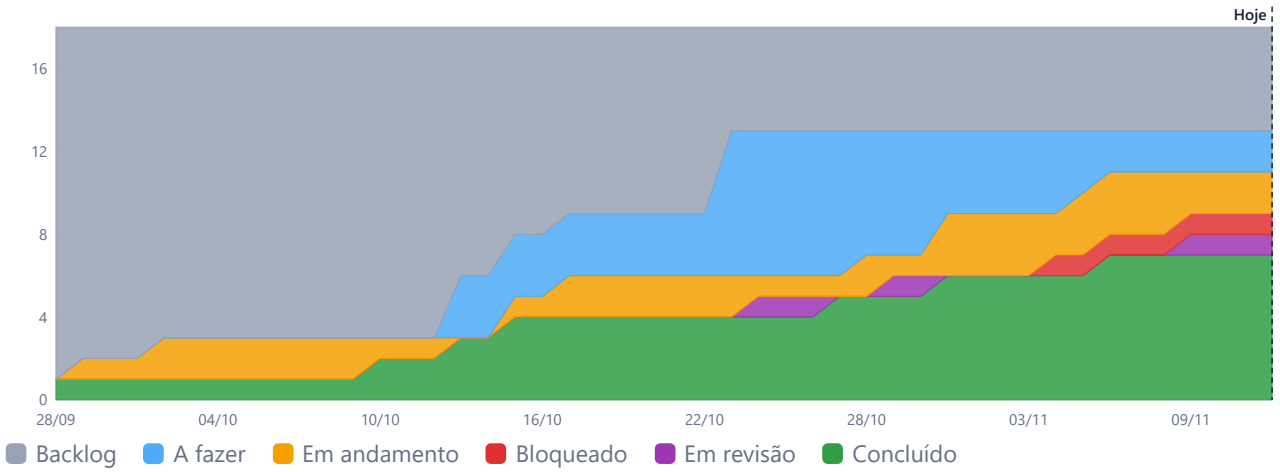

Leitura: a distância **vertical** entre a faixa "Concluído" e o topo das faixas ativas é o WIP; a distância **horizontal** aproxima o tempo de ciclo. Faixas que se alargam indicam gargalo; faixa de concluídas plana indica que nada está sendo entregue.

WIP ATUAL

4

Andamento 2 · Revisão 1 · Bloq. 1

VAZÃO (14 DIAS)

2

Anterior: 1

TEMPO DE CICLO

11,8d

Início → conclusão (média)

LEAD TIME

26,6d

Criação → conclusão (média)

CHEGADA × SAÍDA

1,5 / 0,8


Iniciadas × concluídas por semana (4 sem.) — WIP crescendo

LEI DE LITTLE


37,3d

Ciclo esperado = WIP ÷ vazão

Curva S progresso ponderado (%)

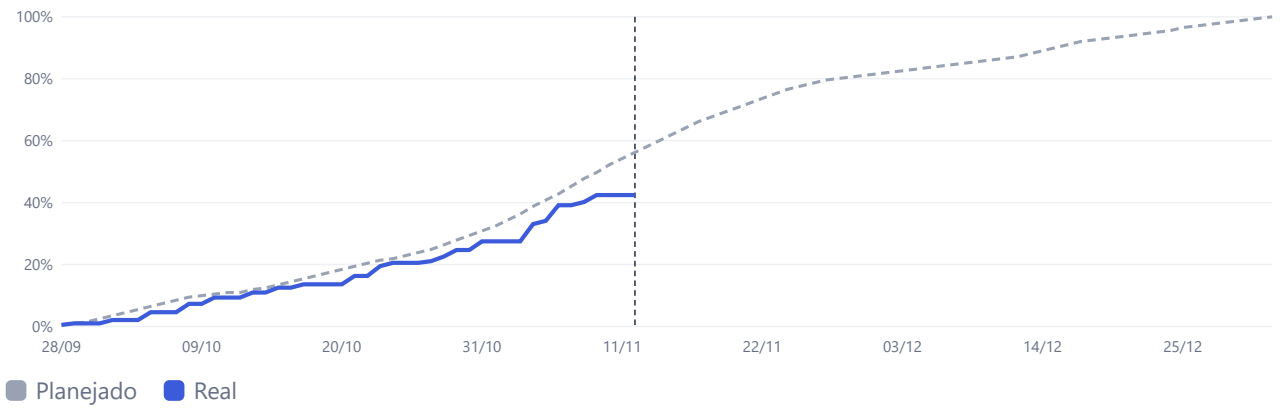

Vazão semanal tarefas concluídas por semana

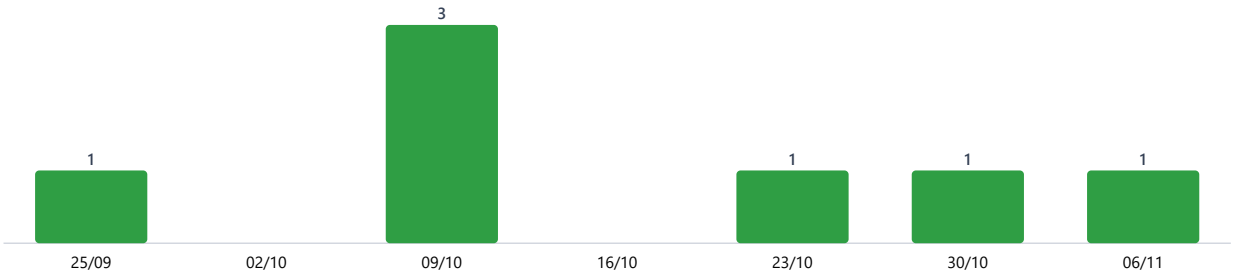

Idade do trabalho em andamento dias desde o início

TAREFA	RESPONSÁVEL	STATUS	IDADE	FIM PLANEJADO
Módulo de cadastro	Eduardo Alves	Em revisão	**16 dias**	08/11/26
Integração com ERP	Carla Mendes	Bloqueado	**13 dias**	17/11/26
Plano de testes	Fernanda Dias	Em andamento	**8 dias**	10/11/26
Módulo de relatórios	Diego Rocha	Em andamento	**7 dias**	22/11/26

Desempenho da equipe

Implantação do novo CRM · posição em 12/11/2026

ENTREGAS NO PRAZO

14% ▲

1 de 7 concluídas até o fim planejado

ATRASO MÉDIO

2,5d

nas 6 entregas atrasadas

PRECISÃO DAS ESTIMATIVAS

1,1×

Mediana de ciclo real ÷ duração planejada (5 tarefas); 1× = no estimado

VAZÃO POR PESSOA

0,2

Entregas por semana por pessoa ativa (4 sem., 5 pessoas)

RETRABALHO

0%

0 tarefas voltaram de status (reaberta ou revisão → andamento)

TEMPO EM BLOQUEIO

8 dias

1 bloqueio

ATUALIZAÇÕES EM DIA

75%

Tarefas ativas atualizadas nos últimos 7 dias

AÇÕES CUMPRIDAS

40%

2 de 5 ações dos follow-ups · 2 vencida(s)

EQUILÍBRIO DE CARGA

1,7×


Bruno Lima tem 1,7× a média de trabalho pendente

Indicadores por pessoa clique numa pessoa para ver as tarefas dela

PESSOA	TAREFAS	CONCL.	ATIVAS	ATRAS.	NO PRAZO	CICLO	REAL÷EST.	SPI	VAZÃO 4S	RETRAB.	BLOQ.	AÇÕES	ÚLT. ATUALIZ.
Ana Souza	5	4	0	0	25%	9,5d	1,1×	1,00	1	0	0	0	06/11/26 (6d)
Bruno Lima	3	1	0	0	0%	12d	1,1×	0,79	0	0	0	1 (1)	23/10/26 (20d)
Carla Mendes	3	1	1	0	0%	13d	1,2×	0,68	1	0	8	1 (1)	04/11/26 (8d)
Diego Rocha	2	1	1	0	0%	15d	1,1×	0,77	1	0	0	—	06/11/26 (6d)
Eduardo Alves	2	0	1	1	—	—	—	0,64	0	0	0	—	09/11/26 (3d)
Fernanda Dias	2	0	1	1	—	—	—	0,60	0	0	0	1	08/11/26 (4d)
Sem responsável	1	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	—	28/09/26 (45d)


Como ler: "No prazo" = concluídas até o fim planejado. "Ciclo" = mediana de dias do início à conclusão. "Real÷est." = mediana do ciclo real dividido pela duração planejada; acima de 1, a tarefa levou mais tempo que o estimado. SPI = progresso real ÷ planejado das tarefas da pessoa hoje. "Vazão 4s" = concluídas nas últimas 4 semanas. "Retrab." = tarefas que voltaram de status. "Bloq." = dias em bloqueio. "Ações" = ações abertas dos follow-ups (vencidas entre parênteses), ligadas pelo nome do responsável. As métricas medem o que foi registrado no plano e nas atualizações, não a produtividade individual: use-as para achar gargalos e ajudar, não para ranquear pessoas.

Trabalho pendente por pessoa dias-tarefa

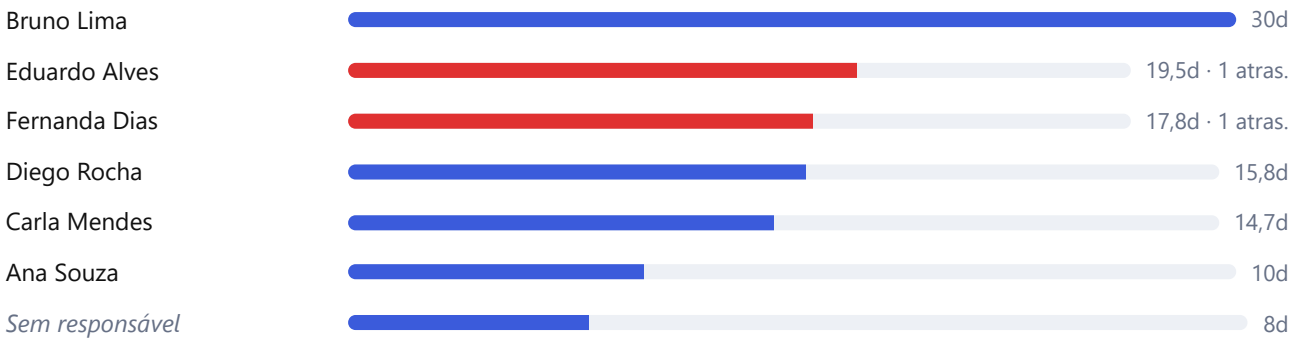

Pendência = soma de (duração planejada em dias × % não concluído). Barra vermelha e "atras." = a pessoa tem tarefa atrasada.

Distribuição das tarefas por status

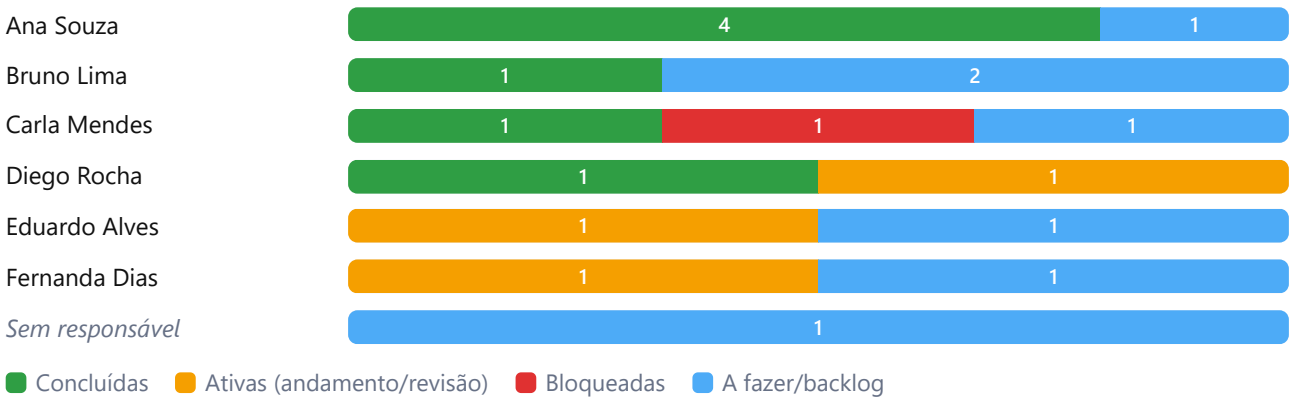

Riscos

Implantação do novo CRM · posição em 12/11/2026

CHANCE DE CUMPRIR O PRAZO

11% ▲

Metade das simulações termina até 28/01/27; 85% até 25/02/27

RESERVA DE PRAZO

0 dias ▲

Fim do plano 01/01/27 vs prazo 01/01/27 · pelo ritmo atual: -4d

EXPOSIÇÃO AO RISCO

80% ▲

do trabalho pendente está em tarefas de risco alto ou crítico

RISCOS ALTOS / CRÍTICOS

8 ▲

3 crítico(s) entre 11 tarefas abertas

CAMINHO CRÍTICO

6

tarefas abertas sem folga · 0 atrasada(s) · 1 quase crítica(s) (folga ≤ 5d)

DEPENDÊNCIAS EM RISCO

4 ▲

ligações com predecessora atrasada ou bloqueada antes do início da sucessora

CONCENTRAÇÃO DE TRABALHO

26%

do trabalho pendente está com Bruno Lima · 7% sem responsável

BLOQUEIOS ABERTOS

1 ▲


Nenhum bloqueio resolvido ainda

Matriz de risco tarefas abertas · clique numa célula para filtrar

Prob. ↓ / Impacto →	Baixo	Médio	Alto
Alta	0 Médio	3 Alto	3 Crítico
Média	0 Baixo	0 Médio	2 Alto
Baixa	0 Baixo	0 Baixo	3 Médio


Probabilidade sobe com atraso, bloqueio, avanço abaixo do plano, início não feito, predecessora com problema, falta de atualização ou de responsável e sobrecarga do responsável. **Impacto** sobe com caminho crítico, folga pequena, marco, número de sucessoras e duração. Nível = probabilidade × impacto (1 a 9).

Previsão de término simulação Monte Carlo

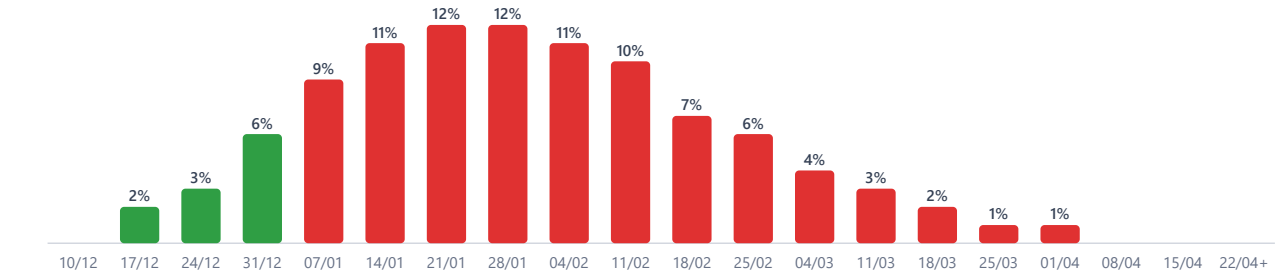

Barras: % das 5.000 simulações que terminam em cada semana. É um modelo, não uma medida: sorteia a vazão de semanas reais (últimas 6: 0, 3, 0, 1, 1, 1 entregas) até concluir as 11 tarefas pendentes, tratando todas como do mesmo tamanho e supondo que o ritmo passado se mantém. Semente fixa 20261112: os mesmos dados dão sempre o mesmo resultado.

Tendência do SPI últimos 90 dias · 100% = no plano

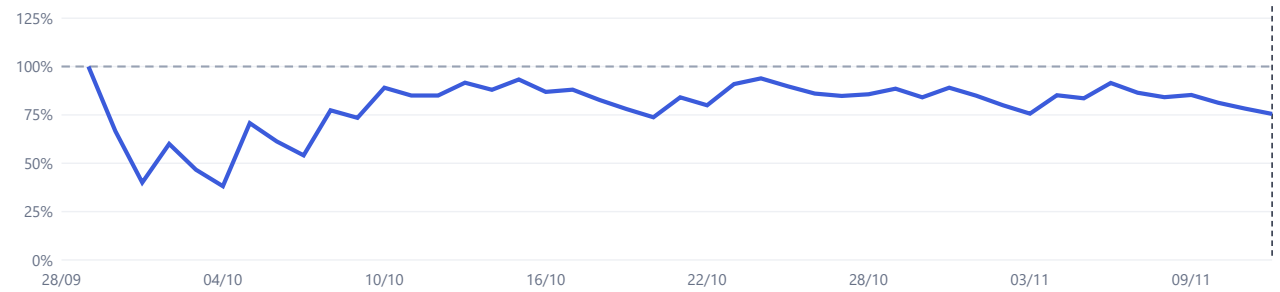

Registro de riscos nível médio ou maior

NÍVEL	#	TAREFA	RESPONSÁVEL	FIM	STATUS	PROB.	IMPACTO	FATORES
Crítico 9	13	**Plano de testes**	Fernanda Dias	10/11/26	Em andamento	Alta	Alto	atrasada 2d · 5 sucessoras
Crítico 9	9	**Integração com ERP**	Carla Mendes	17/11/26	Bloqueado	Alta	Alto	bloqueada há 8d · folga 5d · 6 sucessoras · 21 dias de duração
Crítico 9	10	**Módulo de relatórios**	Diego Rocha	22/11/26	Em andamento	Alta	Alto	27 p.p. abaixo do plano · caminho crítico · 5 sucessoras · 21 dias de duração
Alto 6	8	**Módulo de cadastro**	Eduardo Alves	08/11/26	Em revisão	Alta	Médio	atrasada 4d · 1 sucessora · 15 dias de duração
Alto 6	11	**Notificações e alertas**	Eduardo Alves	24/11/26	A fazer	Alta	Médio	não iniciada (início 07/11/26) · predecessora atrasada (#8) · 18 dias de duração
Alto 6	12	**Migração de dados**	Bruno Lima	27/11/26	A fazer	Alta	Médio	não iniciada (início 10/11/26) · predecessora bloqueada (#9) · 18 dias de duração
Alto 6	14	**Testes integrados**	Fernanda Dias	07/12/26	Backlog	Média	Alto	predecessora atrasada (#9, #13) · caminho crítico · 4 sucessoras · 15 dias de duração
Alto 6	18	**Operação assistida**	—	01/01/27	Backlog	Média	Alto	sem responsável · caminho crítico
Médio 3	15	**Homologação com usuários**	Ana Souza	17/12/26	Backlog	Baixa	Alto	caminho crítico · 3 sucessoras · 10 dias de duração
Médio 3	16	**Treinamento dos usuários**	Bruno Lima	24/12/26	Backlog	Baixa	Alto	caminho crítico · 2 sucessoras · 12 dias de duração
Médio 3	17	◆ **Go-live**	Carla Mendes	25/12/26	Backlog	Baixa	Alto	caminho crítico · marco · 1 sucessora

Etiquetas amarelas aumentam a probabilidade; cinzas aumentam o impacto. Clique numa linha para editar a tarefa.
